


Check-Liste zur Vorbereitung der PSK

Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von
Hauswartungen und Liegenschaftsdienste

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreibers
bern@abri-audit.ch

Damit wir die PSK periodische Schutzraum-Kontrolle durch unsere Kontrolleure professionell durchführen können, bitten wir um Ihre Mithilfe. **Folgende Punkte sind vorgängig zu beachten und zu prüfen:**

- Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten.**
*Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen oder die Schlüssel dem Hauswart/Nachbarn vor dem **Kontroll-Termin** übergeben.*
- Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet.**
Keller-Abteile, wo **Schutzraum-Komponenten** wie oben aufgelistet **integriert/montiert** sind, **müssen zugänglich sein.**
Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt bzw. abmontiert werden.
 - Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD)** müssen vollständig geschlossen und mindestens 90 Grad geöffnet werden können.
Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, Gegenstände.) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen.
 - Ventilationsaggregate (VA)** muss für die Umdrehungen genügend Freiraum haben.
Der Kontrolleur muss mit der **vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA)** in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die Umdrehungen vorfinden.
 - Überdruckventile (UeV)** muss zugänglich sein.
Allfällige davor befindliche Gegenstände müssen weggestellt werden
 - Notausstiege**
Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.
 - Friedensmässige Installationen**
Nachträgliche Einbauten, welche die Kontrolle der Betriebsbereitschaft des Schutzraumes beeinträchtigen, sind für die Dauer der Kontrolle zu entfernen.

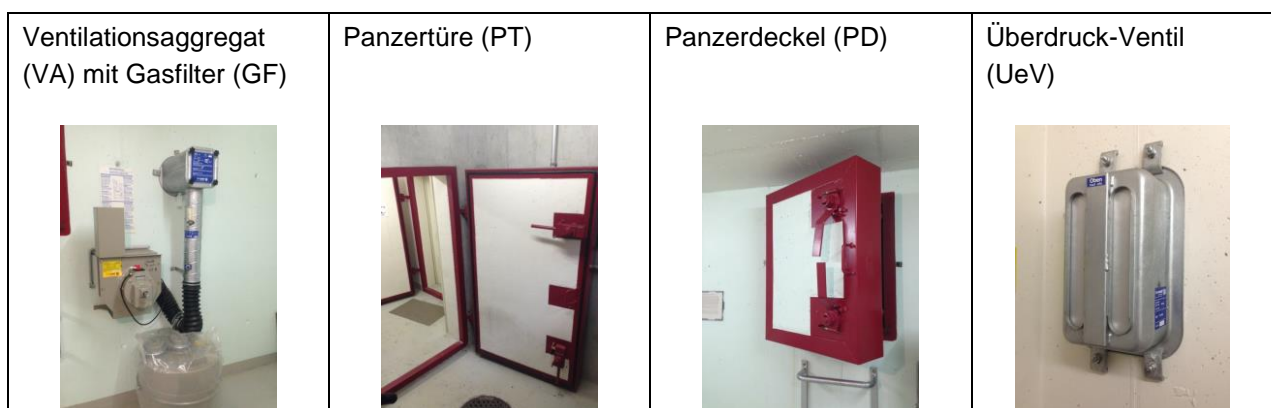

Die Abbildungen dienen als Beispiele.

Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum **mindestens** einmal vorhanden.

Es müssen **immer alle vorhandenen** Komponenten zugänglich sein.

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten.
